

「茅ヶ崎市道の駅整備推進事業」工事進捗状況について

令和2年6月30日（火）報告

茅ヶ崎市柳島向河原地内にて工事を進めております「道の駅（仮称）サザン茅ヶ崎」について、工事進捗状況をアップします。（令和2年6月10日（水）撮影）

（西端部より撮影↓）

- ・盛土造成工事終了しています。




（中央部 地下ピット設置予定地↓）

- ・地下ピットとは給排水設備のメンテナンス空間です。

地下ピット設置のためトンバック（中には採石が入っています。）による土留めを行っています。

地下ピット内の草刈りを行いました。

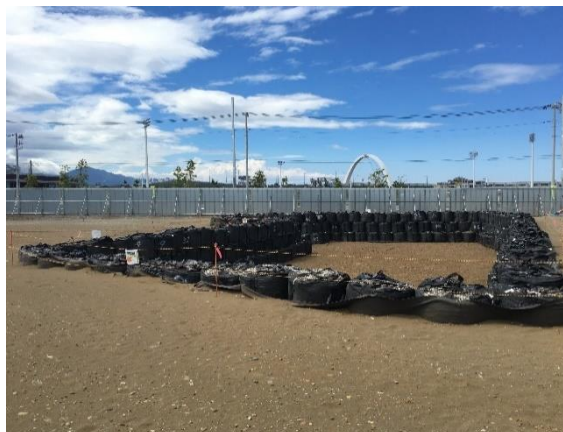

【市道0121号線南側歩道改良工事（その2）】

- ・市道0121号線南側歩道の西側部分の歩道拡幅をするものです。
- ・雨水排水用のU字溝の設置を行っています。

令和2年9月30日完成予定。



※令和2年2月下旬から整備地を囲っているため、中が見えない状況になっています。
